

проект № 0022 "Строительство морга и организация судебно-медицинских экспертиз и патологоанатомической деятельности в г. Горно-Алтайск"

Ид.	СД/Название задачи	Предст.	Длительность	Начало	Окончание	Исполнитель	ПРОЕКТ №22 СТРОИТЕЛЬСТВО МОРГА																							
							Квартал 1	Квартал 3	Квартал 1	Квартал 3	Квартал 1	Квартал 3	Квартал 1	Квартал 3	Квартал 1	Квартал 3														
							Янв	Мар	Май	Июл	Сен	Ноя	Янв	Мар	Май	Июл	Сен	Ноя	Янв	Мар	Май	Июл								
0	0 ПРОЕКТ №22 СТРОИТЕЛЬСТВО МОРГА		698 дней	Чт 28.04.16	Пн 31.12.12		ПРОЕКТ №22 СТРОИТЕЛЬСТВО МОРГА																							
1	1 Начало проекта		0 дней	Чт 28.04.16	Чт 28.04.16	Коваленко С.М./Инвестор	28.04 Начало проекта																							
2	2 Направление предложения о реализации проекта		127 дней	Чт 28.04.16	Пт 21.10.16	Коваленко С.М.	Направление предложения о реализации проекта 21.10																							
3	2.1 Проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта ГЧП публичному партнеру	1	1 день	Чт 28.04.16	Чт 28.04.16	Коваленко С.М.	28.04																							
4	2.2 Разработка и направление публичному партнеру предложения о реализации проекта	30Н+30 дней	60 дней	Пт 10.06.16	Чт 01.09.16	Инвестор	10.06 01.09																							
5	2.3 Рассмотрение предложения в порядке, установленном Правительством РФ и принятие решения	4	28 дней	Пт 02.09.16	Вт 11.10.16	Коваленко С.М.	11.10																							
6	2.4 Проведение переговоров, в том числе в форме совместных совещаний, с инициатором проекта	4	30 дней	Пт 02.09.16	Чт 13.10.16	Коваленко С.М.	02.09 13.10																							
7	2.5 Направление предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки его сравнительного преимущества	6,5	5 дней	Пт 14.10.16	Чт 20.10.16	Коваленко С.М.	14.10 20.10																							
8	2.6 Направление решения, а также оригиналы протокола предварительных переговоров инициатору проекта и размещение решения, предложения о реализации проекта и протоколы переговоров на официальном сайте публичного	7НН	6 дней	Пт 14.10.16	Пт 21.10.16	Коваленко С.М.	14.10 21.10																							
9	3 Закупка и монтаж оборудования в 2015-2016 гг.		178 дней	Чт 28.04.16	Пн 02.01.17		Закупка и монтаж оборудования в 2015-2016 гг. 02.01																							
10	3.1 Проведение конкурсных процедур для определения поставщика оборудования декабрь 2015г.	1	0 дней	Чт 28.04.16	Чт 28.04.16	Коваленко С.М.	28.04 Проведение конкурсных процедур для определения поставщика оборудования декабрь 2015г.																							
11	3.2 Заключение договора на поставку оборудования январь 2016 г.	10	0 дней	Чт 28.04.16	Чт 28.04.16	Коваленко С.М.	28.04 Заключение договора на поставку оборудования январь 2016 г.																							
12	3.3 Поставка оборудования	11	178 дней	Чт 28.04.16	Пн 02.01.17	Коваленко С.М.	02.01																							
13	3.4 Поставлено оборудование для проведения химических и гистологических исследований	12	0 дней	Пн 02.01.17	Пн 02.01.17	Коваленко С.М.	02.01 Поставлено оборудование для проведения химических и гистологических исследований																							
14	4 Оценка эффективности проекта уполномоченным органом	8	70 дней	Пн 24.10.16	Пт 27.01.17	Буйдышева С.В.	Оценка эффективности проекта уполномоченным органом 27.01																							
15	4.1 Оценка эффективности проекта, определение сравнительного преимущества проекта	8;7	30 дней	Пн 24.10.16	Пт 02.12.16	Буйдышева С.В.	24.10 02.12																							

СОГЛАСОВАНО:


Куратор проекта Сафронова О.А. " " 2016г.

Руководитель проекта Коваленко С.М. " " 2016г.

Заказчик проекта Пелеганчук В.А. " " 2016г.
Руководитель Проектного офиса Ротарь Ф. Н. " " 2016г.

проект № 0022 "Строительство morga и организация судебно-медицинских экспертиз и патологоанатомической деятельности в г. Горно-Алтайск"

№	СД	Название задачи	Предшест.	Длительность	Начало	Окончание	Исполнитель	Квартал 1		Квартал 3		Квартал 1		Квартал 3		Квартал 1		Квартал 3		Квартал 1			
								Янв	Мар	Май	Июл	Сен	Ноя	Янв	Мар	Май	Июл	Сен	Ноя	Янв	Мар	Май	Июл
16	4.2	Утверждение заключения об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе (положительное заключение) либо заключение о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества (отрицательное заключение)	15НН	35 дней	Пн 24.10.16	Пт 09.12.16	Буйдышева С.В.																
17	4.3	Размещение решения, предложения о реализации проекта и протокола переговоров на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет", за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну	16;15	5 дней	Пн 12.12.16	Пт 16.12.16	Буйдышева С.В.																
18	4.4	Принятие решения о реализации проекта ГЧП (утверждение)	17	30 дней	Пн 19.12.16	Пт 27.01.17	Буйдышева С.В.																
19	5	Решение о реализации проекта ГЧП принято	18	0 дней	Пн 27.01.17	Пт 27.01.17	Буйдышева С.В.																
20	6	Реализация проекта ГЧП	18	71 дней	Пн 30.01.17	Пн 08.05.17	Коваленко С.М.																
21	6.1	Организация и проведение конкурса на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве	19	45 дней	Пн 30.01.17	Пт 31.03.17	Коваленко С.М.																
22	6.2	Заключение соглашения с победителем конкурса на право	21	16 дней	Пн 03.04.17	Пн 24.04.17	Коваленко С.М.																
23	6.3	Поддача заявления об отказе от права постоянного бессрочного пользования земельным участком	22	5 дней	Вт 25.04.17	Пн 01.05.17	Мамаков Ч.Ю.																
24	6.4	Отчуждение земельного участка	23	5 дней	Вт 02.05.17	Пн 08.05.17	Микьянец В.И.																
25	7	Заключено соглашение о государственно-частном партнерстве	22	0 дней	Пн 24.04.17	Пн 24.04.17	Коваленко С.М.																
26	8	Разработка и экспертиза ПСД	22	90 дней	Вт 09.05.17	Пн 11.09.17	Инвестор																
27	8.1	Разработка ПСД	24;25	60 дней	Вт 09.05.17	Пн 31.07.17	Инвестор																
28	8.2	Получение заключения на ПСД	27	30 дней	Вт 01.08.17	Пн 11.09.17	Инвестор																
29	9	Получено заключение государственной экспертизы	28	0 дней	Пн 11.09.17	Пн 11.09.17	Инвестор																
30	10	Строительство morga	29	159 дней	Вт 12.09.17	Пт 20.04.18	Инвестор																
31	11	Закупка и монтаж оборудования в 2017 г.	30НН+10	659 дней	Вт 30.01.17	Пт 20.04.18	Инвестор																
32	12	Перенос оборудования из старого здания morga и административного здания в новое здание morga	30НН+10	659 дней	Вт 30.01.18	Пт 20.04.18	Коваленко С.М.; Инвестор																

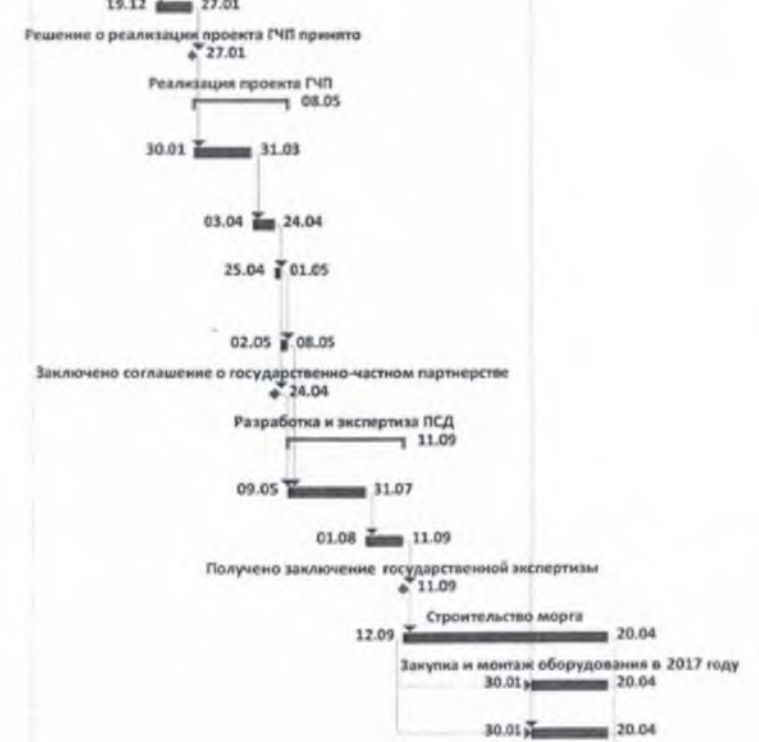



СОГЛАСОВАНО:
 Куратор проекта _____ Есафорова О.А. "_____" "_____" 2016г.
 Руководитель проекта _____ Коваленко С.М. "_____" "_____" 2016г.



Заказчик проекта _____ Пелеганчук В.А. "_____" "_____" 2016г.
 Руководитель Проектного офиса _____ Ротарь Ф.Н. "_____" "_____" 2016г.

проект № 0022 "Строительство морга и организация судебно-медицинских экспертиз и патологоанатомической деятельности в г. Горно-Алтайск"

Ид.	СД	Название задачи	Предшест.	Длительность	Начало	Окончание	Исполнитель	Квартал 1		Квартал 3		Квартал 1		Квартал 3		Квартал 1		Квартал 3				
								Янв	Мар	Май	Июл	Сен	Ноя	Янв	Мар	Май	Июл	Сен	Ноя	Янв	Мар	Май
33	13	Ввод здания морга в эксплуатацию	30;31;32	0 дней	Пт 20.04.18	Пт 20.04.18	Инвестор														20.04	Ввод здания морга в эксплуатацию
34	14	Реконструкция старого здания для размещения вспомогательных	33	90 дней	Пн 23.04.18	Пт 24.08.18	Инвестор														23.04	
35	15	Ввод вспомогательных помещений в эксплуатацию	34	0 дней	Пт 24.08.18	Пт 24.08.18	Инвестор														24.08	Ввод вспомогательных помещений в эксплуатацию
36	16	Организация и производство судебно-медицинских экспертиз и патологоанатомической деятельности	33;35	91 дней	Пн 27.08.18	Пн 31.12.18	Инвестор														27.08	
37	17	Окончание проекта	36	0 дней	Пн 31.12.18	Пн 31.12.18	Коваленко С.														31.12	Окончание проекта

СОГЛАСОВАНО:

Куратор проекта  Сафронова О.А. " " 2016г.
 Руководитель проекта  Коваленко С.М. " " 2016г.

Заказчик проекта  Пелеганчук В.А. " " 2016г.
 Руководитель Проектного офиса  Ротарь Ф. Н. " " 2016г.
