Итоги выполнения Плана мероприятий по реализации программы «Сильный Алтай» за 2020 год

Министерство здравоохранения Республики Алтай

87,5%
мероприятий
завершены
в 2019 г.

26

мероприятий

11%
мероприятий
переходящих с
2019 г.

100%
мероприятий,
завершены
в 2020 г.

8%
мероприятий
со сроком начала
реализации в 2021 г.

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

в части мероприятий Министерства здравоохранения РА

62

контрольных точек в 2020 г.

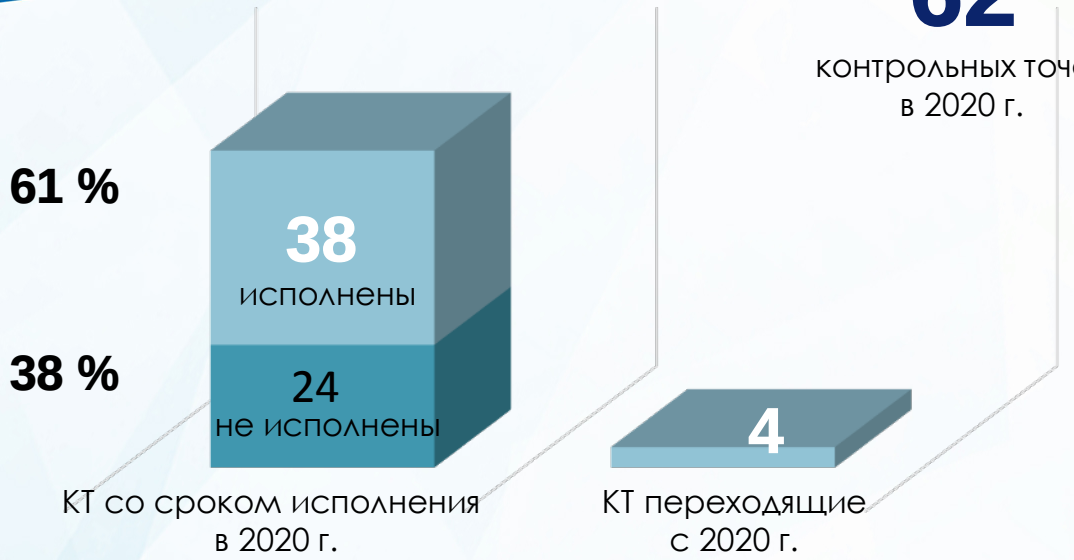

Источники финансирования	2020 год (тыс. руб.)		
	план	факт	кассовое исполнение, %
ВСЕГО (за счет всех источников)	446 794,46	399 189,22	89,3
федеральный бюджет	437 956,9	391 063,16	89,3
республиканский бюджет	8 837,56	8 126,06	91,9
местные бюджеты	____	____	____
внебюджетные источники	____	____	____

Контрольные точки с риском неисполнения

4

Контрольные точки

Увеличение площади здания ФАПа в с.Саратан МО «Улаганский район»

КТ	Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	01.01.2021 г. 01.02.2021 г.
КТ	Выполнены работы по капитальному ремонту	01.02.2021 г. 01.03.2021 г.
КТ	Заключение соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета	01.03.2021 г. 01.12.2021 г.
КТ	Объект введен в эксплуатацию	01.12.2021 г. 31.12.2021 г.

На основании ходатайства Министерства здравоохранения РА в адрес Главы Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай О.Л. Хорохордину данный объект снят с контроля в связи с нецелесообразностью и оптимизацией бюджетных средств. В Министерство экономического развития РА направлены предложения по внесению изменений в План мероприятий («дорожной карты») по реализации программы развития «Сильный Алтай», утвержденного распоряжением Правительства Республики Алтай от 5 ноября 2019 г. № 593-р

Контрольные точки с риском неисполнения

4

Контрольные точки

Капитальный ремонт поликлиники с.Улаган Улаганского района

КТ	Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	01.01.2019 г. 01.02.2019 г.
КТ	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета	01.01.2021 г. 14.02.2021 г.
КТ	Выполнены строительно-монтажные работы	01.05.2021 г. 31.12.2021 г.
КТ	Объект введен в эксплуатацию	31.12.2021 г. 01.06.2022 г.

Проектно-сметная документация была направлена на государственную экспертизу. Получено отрицательное заключение, необходима существенная доработка проектно-сметной документации либо разработка новой проектно-сметной документации, что требует дополнительных бюджетных ассигнований.

Строительство СВА с. Кызыл-Озек

Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Республиканская больница» (реконструкция незавершенного строительства пристройки), г. Горно-Алтайск

с. Усть-Мута

с. Тюдрала

с. Теленгит-Сортогой

Строительство ФАПов

с. Озерное

с. Талда

с. Туекта

Строительство ФАПов

с. Улита

с. Хабаровка

с. Толгоек

Строительство ФАПов

с. Малая Иня

с. Боочи

с. Верх-Черга

Строительство ФАПов

с. Каярлык

с. Козуль

с. Огневка

Строительство ФАПов
